

MMTC R32

Pompe à chaleur collective air/eau

Contrôles lors de la mise en service

LM


Info-ATS-002_v01

19/12/2024


Sur l'unité extérieure sous tension :

1. Vérifier la bonne connexion de l'alimentation électrique de l'installation

- Section de câble,
- Serrage des connecteurs



2. Vérifier si les câbles de puissance sont bien séparés des câbles de communication.

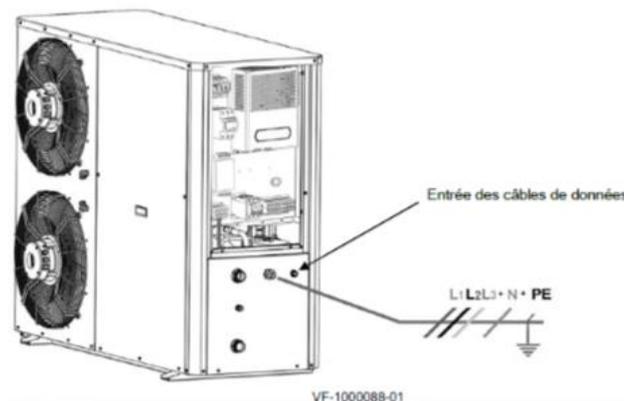

3. Mettre la PAC en demande :

4. Mesurer la tension de la pompe à chaleur pour vérifier que celle-ci ne diminue pas lorsque :

- La pompe chaleur est en fonctionnement.
- Les appoints électriques fonctionnent.

5. Mesurer l'équilibre entre les phases lorsque :

- La pompe à chaleur est en fonctionnement.
- Les appoints électriques fonctionnent.

6. Vérifier les connectiques électriques

- Compresseur
- Ventilateurs
- Cartes, contacteurs, etc...

